

# 浙江省水利厅

---

## 2019年1—5月全省农村饮用水达标提标行动 进展情况

### 一、建设进展

2019年全省计划投入资金56.6亿元，解决农村饮用水达标提标人口410万人。1—5月，全省完成投资20.9亿元，解决农村饮用水达标提标人口137.9万人（年度完成率33.7%），其中城市管网延伸解决74.2万人。台州、温州、金华分别解决农村饮用水达标提标人口38.8万人、20.5万人、19.7万人，位居全省前列；丽水、宁波、衢州建设进度相对滞后。

2019年度1—5月，全省已开工农村饮用水达标提标工程1474处（占年度项目总数的48.4%），完工403处。温州、丽水、绍兴分别已开工建设373处、242处、194处，位居全省前列。

图1 2019年1-5月各设区市达标提标人口年度完成率

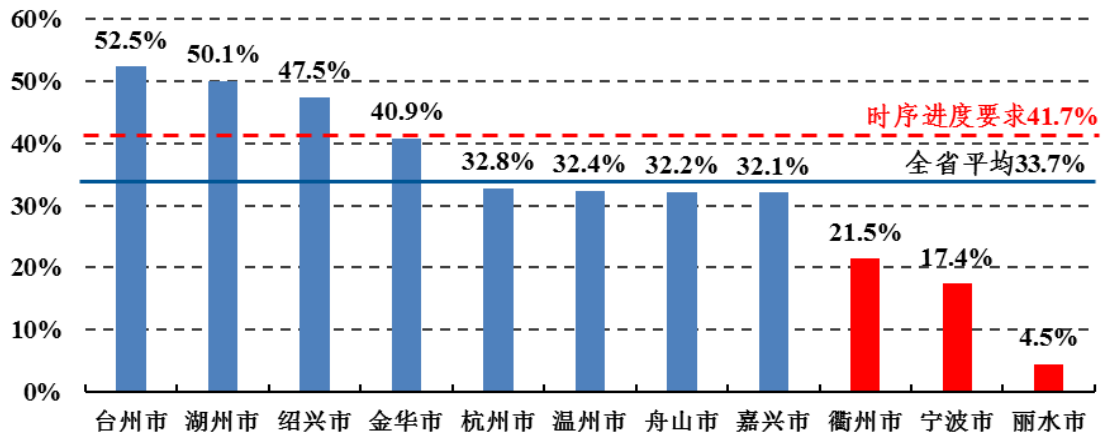


表1 2019年1-5月各县(市、区)年度建设进展前十名、后十名


排名	年度建设进展前十名 (按完成率排名)			年度建设进展后十名 (按开工率排名)		
	县(市、区)	完成率	开工率	县(市、区)	完成率	开工率
1	南浔	100%	100%	鄞州	0%	0.0%
2	瑞安	75.3%	63.2%	临海	0%	0.9%
3	椒江	62.7%	100%	嘉善	0%	33.3%
4	义乌	58.2%	100%	德清	0%	33.3%
5	东阳	57.7%	82.5%	龙泉	0%	47.4%
6	桐乡	54.1%	100%	景宁	0%	55.3%
7	诸暨	53.2%	79.5%	海曙	0%	66.7%
8	嵊州	48.8%	85.6%	普陀	0%	66.7%
9	淳安	46.3%	100%	青田	0%	73.8%
10	江山	46.0%	100%	柯城	0%	80.0%

注：年度建设进展的统计对象是纳入省级三年行动计划的当年建设项目。

## 二、县级统管进展

全省计划 2019 年 6 月底前全面建立县级统管长效机制。目前 83 个县（市、区）均已明确县级统管机构，其中 58 个县（市、区）明确由水务公司统管，25 个县（市、区）成立农村供水工程专管机构；全省 34.1% 的农村供水工程落实了县级统管责任。请各地加快落实进度，确保到 6 月底所有农村供水工程县级统管责任全面落实。

图2 2019年1-5月各设区市农村供水工程县级统管责任落实率

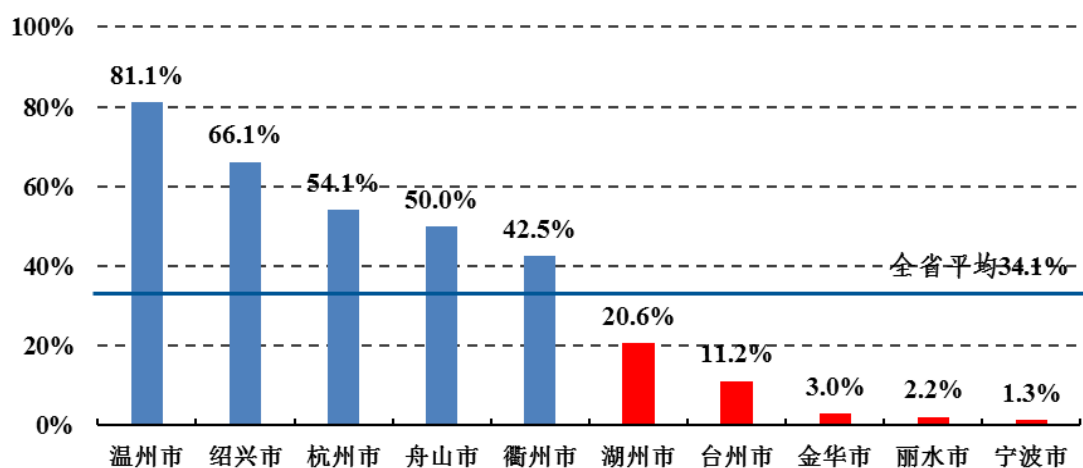


注：县级统管责任落实率为已落实统管责任的农村供水工程数与总数之比。

## 三、省级明查暗访发现问题


按照省委省政府《2019 年督查检查考核年度计划》，对标水量、水质等城乡同质发展目标和落实县级统管责任要求，省水利厅以“四不两直”方式开展明查暗访，加强农村饮水安全工作监管。

### 1、暗访发现问题上报整改及省级“回头看”情况

前四轮暗访发现 192 处工程存在问题，其中 140 处工程已上报完成整改（含“回头看”核实完成整改），52 处已明确整改方案。

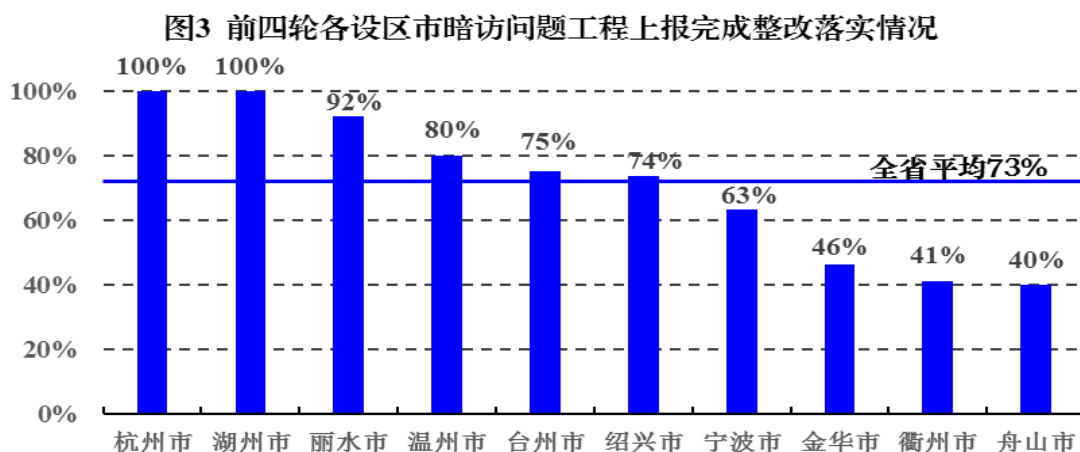

5 月份，省水利厅对 7 个设区市、15 个县（市、区）、27 处上报完成问题整改的工程进行“回头看”，发现 11 处供水工程已完成整改。16 处工程仍未整改到位，占比 59.3%，其中青田 4 处，建德 3 处，淳安、瑞安、松阳各 2 处，兰溪、玉环、景宁各 1 处。

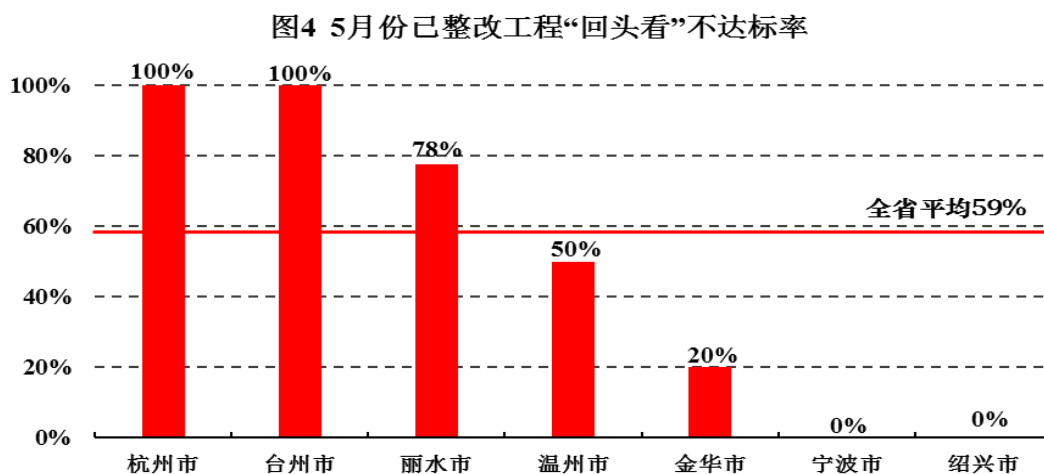


注：不达标率为“回头看”仍不达标工程数与“回头看”总工程数之比；比率越高，整改落实越不到位。

## 2、第五轮明查暗访情况

省水利厅对全省 9 个设区市（嘉兴、舟山除外）、32 个县（市、区）、71 处农村供水工程开展第五轮明查暗访，发现 36 处存在饮水安全问题，占比 51%，其中 13 处未上报省级三年行动计划。暗访发现的 36 处工程存在 76 个饮水安全问题，其中：上报完工项目但未入户通水 1 个，净化或消毒设施未配齐 14 个、设施未使用 4 个，建设不规范 2 个、统管单位责任人未到位 15 个，水源保护不到位 1 个，水质不合格 35 个，水量水压问题 4 个。

图5 第五轮明查暗访问题工程占比率

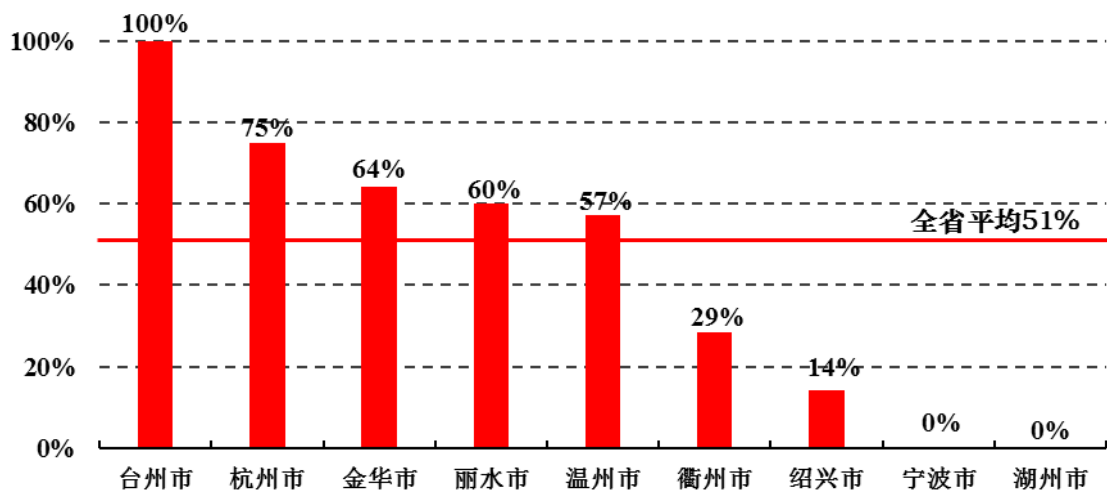

注：占比率为不达标工程数与暗访总工程数之比；占比越高，问题越突出。

各地应给予高度重视，尽快落实整改措施，相关整改意见请于 6 月 30 日前报送省水利厅。同时，前四轮发现问题的整改措施要尽快实施，省水利厅将加大“回头看”力度。

附件：第五轮农村饮用水达标提标行动明查暗访问题清单

浙江省水利厅

2019年6月24日

送：省生态环境厅、省建设厅、省农业农村厅、省卫生健康委，各有关市、县（市、区）人民政府，各有关市、县（市、区）水利（水电、水务）局。
